


Name	Arbeit	Woche 13, 2019										Woche 14, 2019							Woche 15, 2019							Woche 16, 2019							Woche 17, 2019				
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Definition	10 T																																				
Charta [M]	1 T																																				
Lastenheft [M]	3 T																																				
Pflichtenheft [M]	3 T																																				
Risikoanalyse [M]	3 T																																				
Planung	17 T																																				
Grobdesign [M]	1 T																																				
Architektur festlegen	1 T																																				
Feindesign [M]	12 T																																				
Grafik Lib finden	3 T																																				
Netzwerk-Protokoll definieren	3 T																																				
Mockups	2 T																																				
Wie Metadaten filtern?	2 T																																				
Metadaten der Dateien erfassen	2 T																																				
Task zuweisen	1 T																																				
Masterstestplan [M]	3 T																																				
End of Design																																					
Realisation	25 T																																				
Einrichtung von Tests	2 T																																				
Client Tests	1 T																																				
Server Tests	1 T																																				
Client	13 T																																				
UI	10 T																																				
Previews	3 T																																				
Filter Kontrollstrukturen	3 T																																				
3D Visualisierung	2 T																																				
Dateien hinzufügen	1 T																																				
Dateien lokal abspeichern	1 T																																				
Grund Architektur	3 T																																				
Server	6 T																																				
Dateien speichern/verwalten	5 T																																				
Filter implementieren	1 T																																				
Protokoll implementieren	4 T																																				
End of Implementation																																					
Abnahme	13 T																																				
Modultests [M]	4 T																																				
Integrationstests [M]	4 T																																				
Systemtests [M]	4 T																																				
Akzeptanztest [M]	1 T																																				

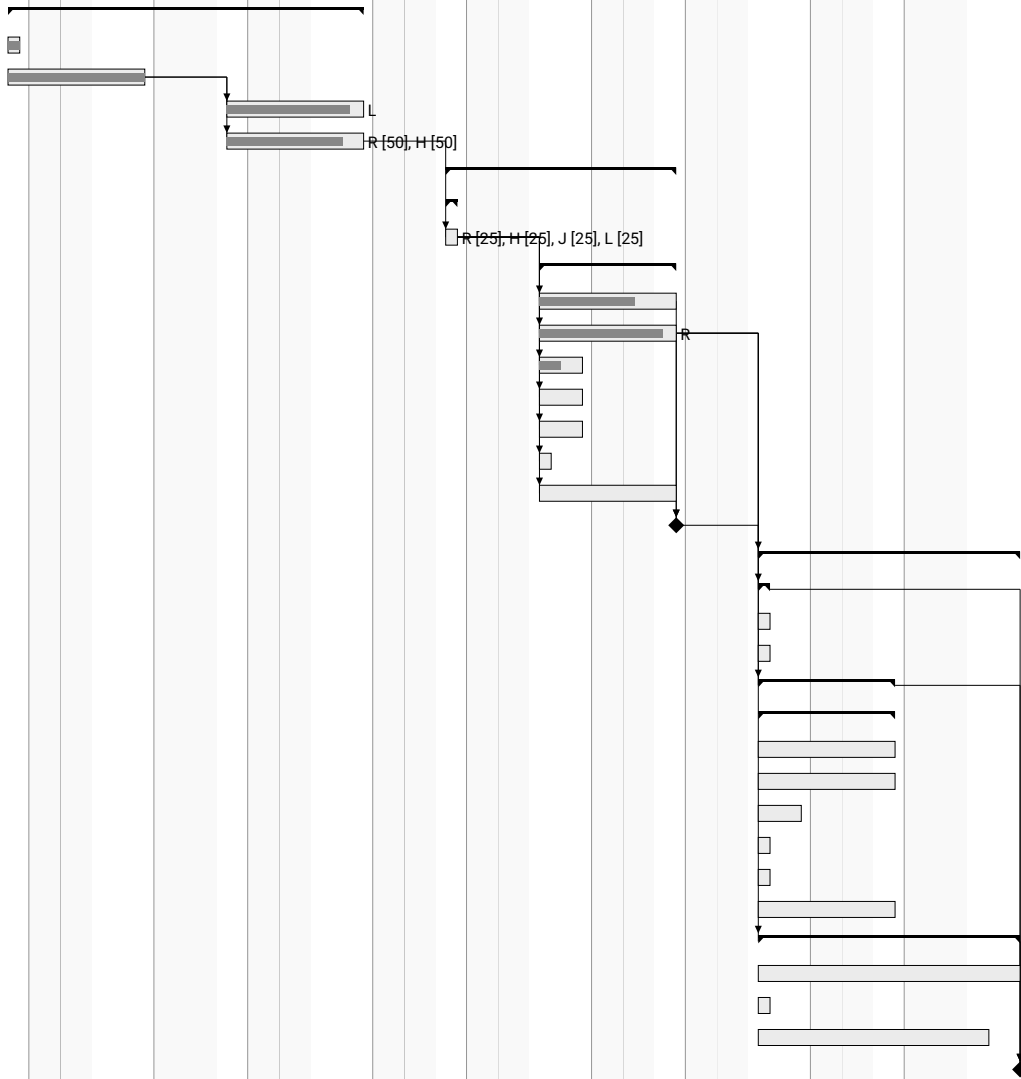

		Woche 18, 2019							Woche 19, 2019							Woche 20, 2019							Woche 21, 2019							Woche 22, 2019							Woche 23, 2019							Woche 24, 20...			
27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...

WBS	Name	Beginn	Ende	Arbeit	Dauer	Lose	Kosten	Zugewiesen zu	% Abgeschlossen
1	Definition	23.03.	3.04.	10 T	6 T	22 T	0		0
1.1	Chartra [M]	23.03.	23.03.	1 T	1 T	27 T	0		100
1.2	Lastenheft [M]	23.03.	27.03.	3 T	3 T		0		100
1.3	Pflichtenheft [M]	30.03.	3.04.	3 T	3 T	22 T	0	L	90
1.4	Risikoanalyse [M]	30.03.	3.04.	3 T	3 T		0	H, R	85
2	Planung	6.04.	13.04.	17 T	4 T	18 T	0		0
2.1	Grobdesign [M]	6.04.	6.04.	1 T	1 T	21 T	0		0
2.1.1	Architektur festlegen	6.04.	6.04.	1 T	1 T		0	H, J, L, R	0
2.2	Feindesign [M]	9.04.	13.04.	12 T	3 T	18 T	0		0
2.2.1	Grafik Lib finden	9.04.	13.04.	3 T	3 T		0		70
2.2.2	Netzwerk-Protokoll definieren	9.04.	13.04.	3 T	3 T		0	R	90
2.2.3	Mockups	9.04.	10.04.	2 T	2 T	19 T	0		50
2.2.4	Wie Metadaten filtern?	9.04.	10.04.	2 T	2 T	19 T	0		0
2.2.5	Metadaten der Dateien erfassen	9.04.	10.04.	2 T	2 T	19 T	0		0
2.3	Task zuweisen	9.04.	9.04.	1 T	1 T	20 T	0		0
2.4	Mastertestplan [M]	9.04.	13.04.	3 T	3 T	18 T	0		0
3	End of Design	13.04.	13.04.	Keine Angaben	Keine Angaben		0		0
4	Realisation	16.04.	24.04.	25 T	5 T	13 T	0		0
4.1	Einrichtung von Tests	16.04.	16.04.	2 T	1 T	4 T	0		0
4.1.1	Client Tests	16.04.	16.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.1.2	Server Tests	16.04.	16.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.2	Client	16.04.	20.04.	13 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1	UI	16.04.	20.04.	10 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1.1	Previews	16.04.	20.04.	3 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1.2	Filter Kontrollstrukturen	16.04.	20.04.	3 T	3 T	2 T	0		0
4.2.1.3	3D Visualisierung	16.04.	17.04.	2 T	2 T	3 T	0		0
4.2.1.4	Dateien hinzufügen	16.04.	16.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.2.1.5	Dateien lokal abspeichern	16.04.	16.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.2.2	Grund Architektur	16.04.	20.04.	3 T	3 T	2 T	0		0
4.3	Server	16.04.	24.04.	6 T	5 T	0	0		0
4.3.1	Dateien speichern/verwalten	16.04.	24.04.	5 T	5 T		0		0
4.3.2	Filter implementieren	16.04.	16.04.	1 T	1 T	4 T	0		0
4.4	Protokoll implementieren	16.04.	23.04.	4 T	4 T	14 T	0		0
5	End of Implementation	24.04.	24.04.	Keine Angaben	Keine Angaben		0		0
6	Abnahme	27.04.	25.05.	13 T	13 T	0	0		0
6.1	Modultests [M]	27.04.	4.05.	4 T	4 T		0		0
6.2	Integrationstests [M]	7.05.	14.05.	4 T	4 T		0		0
6.3	Systemtests [M]	15.05.	22.05.	4 T	4 T		0		0
6.4	Akzeptanztest [M]	25.05.	25.05.	1 T	1 T		0		0

Name	Kurzname	Typ	Gruppe	E-Mail	Kosten
Robin	R	Arbeit			0
Hendrik	H	Arbeit			0
Jannik	J	Arbeit			0
Lukas	L	Arbeit			0
